

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico

PROYECTO: I008 Plan de migración de frecuencias de enlaces auxiliares de los servicios de Radiodifusión Sonora y de Televisión

Líder del Proyecto:	Chicango Ramírez, Nancy María (nancy.chicango@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Gallo, Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	19/01/2015 - 30/09/2015
Fecha de última actualización:	04/11/2015	Fecha de Fin Base:	30/09/2015
Modificado por:	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO:

Propuesta de migración de los enlaces auxiliares de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión abierta que se encuentran operando con frecuencias fuera de las bandas establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias.

PROPÓSITO:

Reorganizar el uso del espectro radioeléctrico para la operación de enlaces auxiliares de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión abierta; de conformidad a lo establecido en el Plan Nacional de Frecuencias, normativa de canalización de frecuencias y demás marco regulatorio aplicable.

ALCANCE:

Definir las bandas a las que deben migrar los concesionarios de enlaces auxiliares de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión abierta que se encuentran actualmente operando fuera de las bandas establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias.

Beneficios Cualitativos

- .Disponer de un espectro radioeléctrico organizado de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias vigente.
- .Incrementar la disponibilidad de las bandas de frecuencias en función del servicio que les corresponde.

Tipo de Beneficiario

- .Regulador del espectro radioeléctrico
- .Operadores del espectro radioeléctrico

Restricciones


- .Las bandas a proponerse para la migración deben estar atribuidas dentro del Plan Nacional de Frecuencias vigente.
- .Nuevas alternativas de migración establecidas en la normativa vigente por falta de disponibilidad de espectro.
- .Las frecuencias auxiliares a migrar se encuentran asignadas fuera de las bandas atribuidas en el Plan Nacional de Frecuencias.
- .Las frecuencias auxiliares a migrar deben estar en estado activo en la base de concesionarios de radiodifusión sonora y de televisión denominada SIRATV.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 19/01/2015

Fecha de Fin: 30/09/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

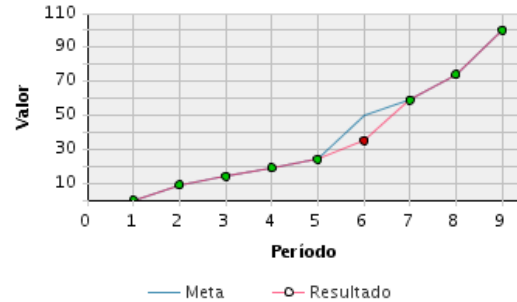

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	9 %	14 %	19 %	24 %	50 %	59 %	74 %	100 %	0 %		
	Avance real acumulado											
	0 %	9 %	14 %	19 %	24 %	35 %	59 %	74 %	100 %			
	Estado											
	●	●	●	●	●	●	●	●	●			

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 30 DEL 2015.- Se cumplió el último hito del GPR (hito 10), correspondiente al Informe enviado al delegado de la Directora Ejecutiva con la propuesta de migración de algunos enlaces auxiliares de radiodifusión sonora para su aprobación y resolución respectiva	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	02/10/2015 - 12:43 PM
SEPTIEMBRE 2015.- Se cumplió el hito 9 del presente proyecto, el cual incluye el envío del Informe a la Directora de la DRE, el cual contiene la propuesta de migración de algunos enlaces auxiliares de radiodifusión sonora para su aprobación	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	25/09/2015 - 04:14 PM
AGOSTO 2015.- Se cumplió el hito 8, correspondiente al acta de reunión de trabajo en la que se detalla el análisis total técnico y legal de la situación actual de los concesionarios identificados para migrar y se determina a los concesionarios que realmente deben migrar, para los cuales se presentará una propuesta de migración.	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	08/09/2015 - 08:55 AM
JULIO 2015.- Se cumplió con el hito 7, correspondiente a la identificación de enlaces auxiliares de radiodifusión sonora que están fuera de las bandas del Plan Nacional de Frecuencias para los cuales se planteará una propuesta de migración	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	22/07/2015 - 11:07 AM
JUNIO 2015: Los hitos a entregarse a finales del mes de junio del 2015 (hito 5 y 6), correspondientes al informe con la propuesta de migración de los enlaces auxiliares de televisión que se encontraban fuera de las bandas establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias, no se ejecutó, debido a una disposición verbal de parte de la Dirección de Regulación del Espectro Radioeléctrico, la cual indicó que al momento se encuentra analizando la posibilidad de que la banda de 6425 a 7100 MHz actualmente asignada para enlaces auxiliares de TV se asigne para enlaces fijos punto a punto de los servicios de telecomunicaciones, razón por la cual se pidió que se suspenda la asignación de frecuencias dentro de la referida banda hasta finalizar su análisis.	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	13/07/2015 - 09:00 AM
MAYO 2015: De los 18 enlaces auxiliares identificados para la migración, se detectó que 14 enlaces correspondían a estaciones privadas de televisión cuyos contratos de concesión están próximos a vencer por lo que no se creyó conveniente la migración de los mismos, dado a la gran inversión que representan y que el concesionario actual no tiene la garantía, una vez que se llame a concurso público las frecuencias de su estación, de continuar con la concesión de las mismas.	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	17/06/2015 - 11:49 AM
ABRIL 2015: Se mantuvo una reunión del grupo de trabajo en la que se definió los enlaces auxiliares que no serán considerados para la migración y sus respectivos motivos, así como se identificó a 18 enlaces auxiliares que definitivamente tendrán que migrar.	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	05/05/2015 - 05:00 PM
MARZO 2015: Se mantuvo una reunión del grupo de trabajo en la que se hizo el análisis de la información recopilada respecto a la situación legal y otros aspectos de operación de los enlaces auxiliares a migrar a fin de depurar la lista definitiva de enlaces a migrar y el procedimiento correspondiente.	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	02/04/2015 - 03:03 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
FEBRERO 2015: En cumplimiento del Hito 1, se puso en conocimiento del Director de la Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico el informe con la identificación de las frecuencias auxiliares del servicio de TV que deben ser migradas a bandas dentro del Plan Nacional de Frecuencias u otras alternativas de enlace que la normativa vigente lo permita.	CHICANGO RAMIREZ, NANCY MARIA	19/02/2015 - 10:01 AM

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 18, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Informe con el listado de las frecuencias auxiliares a ser migradas, correspondientes al servicio de televisión abierta, enviado al Director de la DGER para su conocimiento.	4-Inicio de Trabajo	12/02/2015		03/02/2015		Sí	9.0
2	Acta firmada de reunión de trabajo en la que se detalla el primer avance del análisis técnico y legal de la situación actual de los concesionarios identificados y seleccionados para migrar sus frecuencias auxiliares del servicio de televisión.	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	5.0
3	Acta firmada de reunión de trabajo en la que se detalla el segundo avance del análisis técnico y legal de la situación actual de los concesionarios identificados y seleccionados para migrar sus frecuencias auxiliares del servicio de televisión.	5-Entregables Intermedios	29/04/2015		28/04/2015		Sí	5.0
4	Acta firmada de reunión de trabajo en la que se detalla el análisis total técnico y legal de la situación actual de los concesionarios identificados y seleccionados para migrar sus frecuencias auxiliares del servicio de televisión.	5-Entregables Intermedios	22/05/2015		22/05/2015		Sí	5.0
5	Informe de la propuesta de migración de las frecuencias auxiliares del servicio de televisión abierta, hacia las bandas establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias enviado al Director de la DGER para su aprobación.	9-Entregables Formales	15/06/2015		10/07/2015		Sí	15.0
6	Informe aprobado por la DGER sobre la propuesta de	9-Entregables Formales	30/06/2015		29/06/2015		Sí	11.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	migración de las frecuencias auxiliares del servicio de televisión abierta, hacia las bandas establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias, enviado a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.							
7	Informe con el listado de las frecuencias auxiliares a ser migradas, correspondientes al servicio de radiodifusión sonora, enviado al Director de la DGER para su conocimiento.	5-Entregables Intermedios	22/07/2015		21/07/2015		Sí	9.0
8	Acta firmada de reunión de trabajo en la que se detalla el análisis total técnico y legal de la situación actual de los concesionarios identificados y seleccionados para migrar sus frecuencias auxiliares del servicio de radiodifusión sonora.	5-Entregables Intermedios	21/08/2015		20/08/2015		Sí	15.0
9	Informe de la propuesta de migración de las frecuencias auxiliares del servicio de radiodifusión sonora, hacia las bandas establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias enviado al Director de la DGER para su aprobación.	9-Entregables Formales	22/09/2015		24/09/2015		Sí	15.0
10	Informe aprobado por la DGER sobre la propuesta de migración de las frecuencias auxiliares del servicio de radiodifusión sonora, hacia las bandas establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias, enviado a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.	9-Entregables Formales	30/09/2015		30/09/2015		Sí	11.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

14	Incrementar propuestas de uso eficiente del espectro radioeléctrico MEDIANTE la emisión de planes de reorganización de frecuencias conforme la Normativa Vigente.
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Acta de reunión de trabajo detallando el primer avance del análisis técnico y legal de la situación actual de los enlaces inicialmente identificados para migrar.	HITO_2_-_Proyecto_GPR_2015.pdf	02/04/2015
2	Acta de reunión de trabajo para el análisis de las opciones de migración como son bandas de frecuencias u otras opciones tecnológicas para los enlaces que se dispondrá su migración.	HITO_4_Proyecto_GPR_2015.pdf	17/06/2015
3	Acta de reunión de trabajo para realizar el análisis técnico y situación legal de los concesionarios con enlaces auxiliares fuera de banda a fin de determinar el listado definitivo de los enlaces a migrar	HITO_8_-_Proyecto_GPR_2015_(3).pdf	08/09/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
4	Informe con la propuesta de migración de las frecuencias auxiliares del servicio de televisión abierta, hacia las bandas establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias enviado a la Directora de la DRE para su aprobación	HITO_5_Proyecto_GPR_2015.pdf	13/07/2015
5	Informe de identificación de enlaces auxiliares de radiodifusión sonora que están fuera de las bandas del Plan Nacional de Frecuencias para plantear una propuesta de migración	Hito_7_Proyecto_GPR_2015.pdf	22/07/2015
6	Informe de identificación de las frecuencias auxiliares del servicio de televisión que deben ser migradas a bandas dentro del Plan Nacional de Frecuencias u otras alternativas de enlace que la normativa permita	HITO_1.pdf	19/02/2015
7	Informe enviado al delegado de la Directora Ejecutiva con la propuesta de migración de algunos enlaces auxiliares de radiodifusión sonora para su aprobación y resolución respectiva	Hito_10_ARCOTEL-DRE-2015-0807__INFORME_RESOLUCIÓN.pdf	02/10/2015
8	Informe presentado a la Directora de la DRE con la propuesta de migración de algunos enlaces auxiliares de radiodifusión sonora para su aprobación	HITO_9_-_Proyecto_GPR_2015.pdf	25/09/2015
9	Memo de envío del informe al Coordinador Técnico de Regulación de la ARCOTEL	Hito_6_memo_de_envío_de_informe.pdf	03/09/2015
10	Primera parte del informe con la propuesta de migración de enlaces auxiliares de TV enviado al Coordinador Técnico de Control	Informe_parte_1_Hito_6.pdf	03/09/2015
11	Segunda acta de trabajo del equipo, en la que se definen los enlaces auxiliares de televisión que definitivamente deberán migrar	HITO_3_-_Proyecto_GPR_2015.pdf	05/05/2015
12	Segunda parte del informe con la propuesta de migración de enlaces auxiliares de TV enviado al Coordinador Técnico de Control	Informe_parte_2_Hito6.pdf	03/09/2015
