## ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

## Dirección General de Control de Gestión

**PROYECTO: I003** Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Líder del Proyecto: | | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Proaño de la Torre, Ana Vanessa | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Guerrero Loor, Henry Patricio | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Procesos | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 1 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 0.00 |
| Localidad de Gestión: | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 25/09/2013 - 25/03/2015 |
| Fecha de última actualización: | 06/08/2015 | Fecha de Fin Base: | 25/03/2015 |
| Modificado por: | Ron, Karla | Fecha del siguiente Hito: | 25/03/2015 |

### DATOS GENERALES

**Descripción**

-El presente proyecto tiene como objetivo implementar las directrices prioritarias establecidas en el Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI) conforme establece homologados y actividades establecidas en el Acuerdo Ministerial 166 en la entidad.

-El EGSI establece directrices prioritarias que han sido homologadas como hitos del proyecto cuyo plazo de ejecución es de 6 meses.

-La implementación del EGSI reducirá significativamente amenazas, riesgos y vulnerabilidades relacionadas a la gestión de la información, tanto física como electrónica, que procesa la institución. Así mismo, contribuirá a establecer un proceso de mejora continua de la gestión de la seguridad de la información e incrementar la cultura de los servidores públicos en cuanto al manejo de la información que utilizan para cumplir sus funciones sea esta institucional o de la ciudadanía."

**Beneficios Cualitativos**

-Identificar, cuantificar y priorizar los amenazas, riesgos y vulnerabilidades que puedan afectar la seguridad de la información de la entidad.
-Proporcionar a autoridades de las entidades soporte para gestión de la seguridad de la información, en concordancia con la constitución, las leyes y demás normativa legal vigente.
-Contar con estructuras de evaluación y gestión de riesgos de la organización, así como la definición de las responsabilidades individuales de cada miembro a nivel de seguridad con los respectivos acuerdos de confidencialidad.
-Aplicar los estándares internacionales (ISO/IEC 27000) adoptados como normas técnicas ecuatorianas para gestión de la seguridad de la información.
-Incrementar el conocimiento y cultura de los servidores públicos en cuanto a la gestión de la seguridad de la información que utilizan.
-Implementar medidas para evitar problemas y consecuencias no deseadas de una gestión no adecuada de la gestión de la seguridad de la información.
-Compartir información y gestionar incidentes de seguridad de la información afecten a la entidad o al gobierno en su conjunto en coordinación con la SNAP.

**Tipo de Beneficiario**

-Entidades
-Funcionarios/servidores públicas
-Gobierno
-Ciudadanía

**Restricciones**

No existen restricciones.

| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | **Cancelado** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

### % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




**Transcurrido:** 100.00 %
**Fecha de Inicio:** 25/09/2013 **Fecha de Fin:** 25/03/2015

### AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

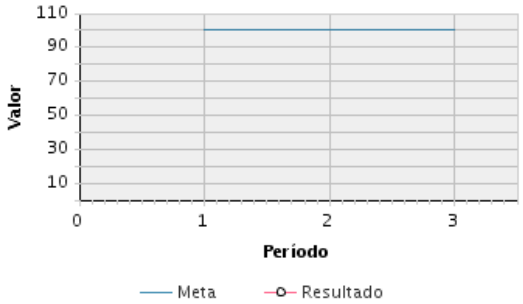


| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Año** | **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** |
| 2015 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | | | | | | | | |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|---|
| MARZO 2015<br>- Por Oficio Nro. SNAP-SGE-2015-000083-O del 12 de marzo de 2015, la Secretaria Nacional de la Administración Pública, como ente encargado de dar control y seguimiento a la implementación del EGSI, procederá a cancelar los proyectos de implementación en las entidades señaladas en el oficio ARCOTEL-2015-DGCG-T028-OF.<br><br>NOVIEMBRE 2014<br>-Por recomendación del Consultor que coordinó el taller sobre el avance de la implementación del EGSI el 10 de noviembre de 2014, el proyecto de Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información de la SENATEL, a partir de este mes se traslada de la Dirección General de Sistemas Informáticos a la Dirección General de Control de Gestión con la finalidad de cumplir el Acuerdo Ministerial 166 de 25 de septiembre de 2013 y mejorar la implementación del proyecto.<br><br>OCTUBRE 2014<br>- Se registra el cumplimiento de algunos hitos relacionados con Controles de acceso físico, Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones, Protección contra amenazas externas y ambientales, Trabajo en áreas seguras, Áreas de carga, despacho y acceso público y Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia.<br><br>SEPTIEMBRE 2014<br>- Se registra el cumplimiento de algunos hitos relacionados con la ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ACUERDOS SOBRE CONFIDENCIALIDAD e INVENTARIO DE ACTIVOS.<br>- Elaboración de las NORMAS DE USO DE CORREO ELECTRÓNICO Y USO DE INTERNET.<br><br>AGOSTO 2014<br>- Se gestionó el cumplimiento de los hitos relacionados con los Acuerdos sobre Confidencialidad y el Inventario de Activos.<br><br>JULIO 2014<br>- Se envía a la máxima autoridad el proyecto de resolución para la aprobación de las POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.<br><br>JUNIO 2014<br>- Se solicita criterio jurídico previo a la aprobación y aplicación de los formatos de los Convenios de Confidencialidad ser suscritos tanto por los servidores de la Institución, como por los proveedores de bienes o servicios. | Ron, Karla | 13/03/2015 - 10:21 AM |

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|---|---|
| MAYO 2014<br>- Se reúne el Comité de Gestión de Seguridad de la Información de la Senatel y se revisa y aprueba el documento de Políticas de Seguridad de la Información.<br>- Se pone en conocimiento de la máxima autoridad, el documento de Políticas de Seguridad de la Información para su aprobación.<br><br>ABRIL 2014<br>- Se revisa el documento de Políticas de Seguridad de la Información para su aprobación.<br><br>MARZO 2014<br>- Se emite la resolución de conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la Información en la SENATEL.<br><br>FEBRERO 2014<br>- Se registra el proyecto en cumplimiento a lo establecido por la SNAP en el Acuerdo 166 emitido en septiembre del 2013. | | |

*Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 0*

## LOCALIDADES

| | Localidad de Impacto |
|---|---|
| | No hay información disponible |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Implementación del EGSI en la institución dispuesta por la máxima autoridad. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 29/01/2014 | | Sí | 0.79 |
| 2 | 1.1.2.- (*) EJECUCIÓN: Política de seguridad de la información de referencia o propia de la institución difundida | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |
| 3 | 2.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Seguimiento de la puesta en marcha de las normas EGSI realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |
| 4 | 2.1.2.- (*) EJECUCIÓN: La difusión, capacitación y sensibilización del contenido del EGSI dispuesta | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |
| 5 | 2.1.3.- (*) EJECUCIÓN: Comité de Gestión de la Seguridad de la Información oficialmente Conformado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 24/03/2014 | | Sí | 0.79 |
| 6 | 2.2.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Oficial de Seguridad de la Información quien actuará como coordinador del CSI oficialmente designado. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 24/03/2014 | | Sí | 0.79 |
| 7 | 2.2.1.2.- (*) EJECUCIÓN: Responsable de seguridad del área de Tecnologías de la Información oficialmente designado. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 24/03/2014 | | Sí | 0.79 |
| 8 | 2.5.1.- (*) EJECUCIÓN: Acuerdos de confidencialidad | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | y de no-divulgación de información conforme la Constitución, las leyes, las necesidades de protección de información de la institución y el EGSI elaborados y aprobados | | | | | | | |
| 9 | 2.5.2.- (*) EJECUCIÓN: Acuerdos de confidencialidad de la información, documento físico o electrónico firmados de forma manuscrita o electrónica por todo el personal de la institución sin excepción | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |
| 10 | 2.5.3.- (*) EJECUCIÓN: Acuerdos firmados, en los expedientes, físicos o electrónicos, de cada funcionario, por parte del área de gestión de recursos humanos custodiados/ archivados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |
| 11 | 2.5.4.- (*) EJECUCIÓN: Firma de los acuerdos de confidencialidad vinculados/ anexados a los procedimientos de incorporación de nuevos funcionarios a la institución, sin excepción | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |
| 12 | 2.5.5.- (*) EJECUCIÓN: Aceptación, entendimiento y firma de acuerdos de confidencialidad y de no divulgación de información por parte de terceros realizados/ ejecutados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |
| 13 | 3.1.2.1.- (*) EJECUCIÓN: inventario de Equipos móviles: teléfono inteligente (smartphone), teléfono celular, tableta, computador portátil, asistente digital personal (PDA), etc realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 14 | 3.1.2.2.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Equipos fijos: servidor de torre, servidor de cuchilla, servidor de rack, computador de escritorio, computadoras portátiles, etc. realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 15 | 3.1.2.3.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Periféricos de entrada: teclado, ratón, micrófono, escáner plano, escáner de mano, cámara digital, cámara web, lápiz óptico, pantalla de toque, etc. realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 16 | 3.1.2.4.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Periféricos de salida: monitor, proyector, audífonos, parlantes, impresora láser, impresora de inyección de tinta, impresora matricial, | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | impresora térmica, plóter, máquina de fax, etc. realizado | | | | | | | |
| 17 | 3.1.2.5.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Periféricos y dispositivos de almacenamiento realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 18 | 3.1.2.6.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Periféricos de comunicaciones realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 19 | 3.1.2.7.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Tableros: de transferencia (bypass) de la unidad ininterrumpible de energía (UPS), de salidas de energía eléctrica, de transferencia automática de energía, etc. realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 20 | 3.1.2.8.- (*)EJECUCIÓN: Inventario de Sistemas: de control de accesos, de aire acondicionado, automático de extinción de incendios, de circuito cerrado de televisión, etc. realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 21 | 3.1.3.1.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Sistemas operativos realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 22 | 3.1.3.2.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Software de servicio, mantenimiento o administración realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 23 | 3.1.3.3.- (*)EJECUCIÓN: Inventario de Paquetes de software o software base realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 24 | 3.1.3.4.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Aplicativos informáticos del negocio realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 25 | 3.1.4.1.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Cables de comunicaciones realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 26 | 3.1.4.2.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Switchs (de centros de datos, de acceso, de borde, de gabinete de servidores, access-ppoint, transceiver, equipo terminal de datos, etc.) realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 27 | 3.1.4.3.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Ruteador (router), cortafuego (firewall), controlador de red inalámbrica, etc. Realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |
| 28 | 3.1.4.4.- (*) EJECUCIÓN: Inventario de Sistema de detección/prevención de intrusos (IDS/IPS), firewall de aplicaciones web, balanceador de carga, switch de contenido, etc. realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 14/08/2014 | | Sí | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3.3.1.- (*) EJECUCIÓN: Uso de correo electrónico institucional reglamentado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 30 | 3.3.2.- (*) EJECUCIÓN: Acceso y uso de la Internet y sus aplicaciones/servicios reglamentado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 31 | 3.3.3.- (*) EJECUCIÓN: Uso de los sistemas de video-conferencia reglamentado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 32 | 3.4.1.- (*) EJECUCIÓN: Información clasificada como pública o confidencial | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 16/09/2014 | | Sí | 0.79 |
| 33 | 4.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Candidatos verificados, previa su contratación, el certificado de antecedentes penales y revisar la información entregada en su hoja de vida | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 34 | 4.1.2.- (*) EJECUCIÓN: Funciones y responsabilidades entregados formalmente a los funcionarios. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 35 | 4.4.1.- (*)EJECUCIÓN: Funciones y las responsabilidades respecto a la seguridad de la información explicadas y definidas, antes de otorgar el acceso a la información, contraseñas o sistemas de información sensibles | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 36 | 5.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Área definida de recepción, con personal y otros medios para controlar el acceso físico al lugar o edificio | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 37 | 5.2.1.- (*) EJECUCIÓN: Hora y fecha de ingreso y salida de permanencia de visitantes en las áreas restringidas registradas y supervisadas. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 38 | 5.2.2.- (*) EJECUCIÓN: Código de uso de una identificación visible para todo el personal y visitantes y de acompañamiento de visitas a áreas restringidas implementado. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 39 | 5.3.1.- (*) EJECUCIÓN: Instalaciones claves protegidas de acceso a personal no autorizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 40 | 5.3.2.- (*)EJECUCIÓN: Impresoras, copiadoras, etc. ubicadas en un área protegida | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 41 | 5.4.1.- (*) EJECUCIÓN: Mantenimientos de las instalaciones eléctricas y UPS realizados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 42 | 5.4.2.- (*) EJECUCIÓN: Mantenimientos en los | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sistemas de climatización y ductos de ventilación realizados / ejecutados | | | | | | | |
| 43 | 5.5.1.- (*) EJECUCIÓN: Código de uso equipos de grabación, cámaras, equipos de vídeo y audio, dispositivos móviles, etc., implementado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 44 | 5.6.1.- (*) EJECUCIÓN: Código de acceso al área de despacho y carga, únicamente a personal identificado y autorizado implementado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 45 | 5.7.1.- (*) EJECUCIÓN: Directrices establecidas para no comer, beber y fumar en las cercanías de las áreas de procesamiento de información | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 46 | 5.8.1.- (*) EJECUCIÓN: Sistema de suministro de energía sin interrupción (UPS) o al menos permitir el cierre/apagado ordenado de los servicios y equipos que soportan las operaciones críticas de los servicios informáticos de la institución identificados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 47 | 5.9.1.- (*) EJECUCIÓN: Diseños/planos y la distribución de conexiones de: datos alámbricas/inalámbricas (locales y remotas), voz, eléctricas polarizadas, etc identificados/documentados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 48 | 6.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Contactos de soporte, necesarios en caso de incidentes documentados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 49 | 6.10.1.- (*) EJECUCIÓN: Prohibir el uso de software no autorizado por la institución. Listado del software autorizado elaborado. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 50 | 6.10.2.- (*) EJECUCIÓN: Software de antivirus y contra código malicioso instalado y actualizado periódicamente | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 51 | 6.10.3.- (*) EJECUCIÓN: Los sistemas operativos y sistemas de procesamiento de información actualizados con las últimas versiones de seguridad disponibles | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 52 | 6.12.1.- (*) EJECUCIÓN: Procedimientos determinado para el resguardo y contención de la información por parte de los responsables del área de Tecnologías de la Información, Oficial de Seguridad de la Información junto con el propietario de la información. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 6.12.2.- (*) EJECUCIÓN: Procedimiento de etiquetado de las copias de respaldo, identificando su contenido, periodicidad y retención definido | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 54 | 6.12.3.- (*) EJECUCIÓN: Extensión (completo/ diferencial) y la frecuencia de los respaldos, de acuerdo a los requisitos del negocio de la institución definida | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 55 | 6.14.1.- (*) EJECUCIÓN: Tecnología para la seguridad de los servicios de red como la autenticación, encriptación y controles de conexión de red incorporada/implementada | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 56 | 6.14.2.- (*)EJECUCIÓN: Soluciones implementadas que proporcionen valor agregado a las conexiones y servicios de red, como la implementación de firewalls, antivirus, etc. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 57 | 6.26.1.- (*) EJECUCIÓN: Accesos y tipos de acceso registrados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 58 | 6.26.2.- (*) EJECUCIÓN: Direcciones y protocolos de red registrados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 59 | 6.26.3.- (*) EJECUCIÓN: Alarmas originadas por el sistema de control de acceso definidas | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 60 | 6.26.4.- (*) EJECUCIÓN: Sistemas de protección como antivirus y los sistemas de detección de intrusos (IDS) activados y desactivados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 61 | 6.27.1.- (*) EJECUCIÓN: Accesos autorizados, incluyendo registrados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 62 | 6.27.2.- (*) EJECUCIÓN: Operaciones privilegiadas monitoreadas | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 63 | 6.27.3.- (*) EJECUCIÓN: Intentos de acceso no autorizados monitoreados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 64 | 6.27.4.- (*) EJECUCIÓN: Alertas o fallas del sistema revisados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 65 | 6.29.1.- (*) EJECUCIÓN: Hora en la que ocurrió el evento registrados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 66 | 6.29.2.- (*) EJECUCIÓN: Información sobre el evento registrados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 67 | 6.29.3.- (*) EJECUCIÓN: Cuenta de administrador y operador que estuvo involucrado registrados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 6.29.4.- (*) EJECUCIÓN: Procesos que estuvieron implicados registrados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 69 | 6.30.1.- (*) EJECUCIÓN: Registros realizados de fallas o errores del sistema revisados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 70 | 6.30.2.- (*)EJECUCIÓN: Medidas correctivas realizadas para garantizar que no se hayan vulnerado los controles revisados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 71 | 6.30.3.- (*) EJECUCIÓN: Registro de fallas esté habilitado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 72 | 6.6.1.- (*) EJECUCIÓN: Niveles de desempeño de los servicios monitoreados para verificar el cumplimiento de los acuerdos | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 73 | 6.6.2.- (*) EJECUCIÓN: Reportes de servicios, reportes de incidentes elaborados por terceros y acordar reuniones periódicas según los acuerdos analizados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 74 | 6.6.3.- (*) EJECUCIÓN: Revisar y verificar los registros y pruebas de auditoría de terceros, con respecto a eventos de seguridad, problemas de operación, fallas relacionados con el servicio prestado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 75 | 6.8.1.- (*) EJECUCIÓN: Proyecciones realizadas de los requerimientos de capacidad futura de recursos para asegurar el desempeño de los servicios y sistemas informáticos | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 76 | 7.10.1.- (*) EJECUCIÓN: Mecanismos generados/ implementados para asegurar la información transmitida por los canales de conexión remota | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 77 | 7.11.1.- (*) EJECUCIÓN: Equipos que se encuentran en las redes documentados e identificados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 78 | 7.12.1.- (*) EJECUCIÓN: Los puertos, servicios (ej., fftp) que no se requieren por necesidades de la institución, eliminados o deshabilitados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 79 | 7.13.1.- (*) EJECUCIÓN: Evaluación de riesgos realizada para identificar los segmentos de red donde se encuentren los activos críticos para la institución | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 80 | 7.15.1.- (*) EJECUCIÓN: Políticas de control de acceso configuradas | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | para el enrutamiento en la red, basándose en los requerimientos de la institución | | | | | | | |
| 81 | 7.16.1.- (*) EJECUCIÓN: Usuarios autorizados autenticados, de acuerdo a la política de control de acceso de la institución, que deberá estar documentada, definida y socializada | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 82 | 7.16.2.- (*) EJECUCIÓN: Registro de definición documentado para el uso de privilegios especiales del sistema | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 83 | 7.16.3.- (*) EJECUCIÓN: Proceso de monitoreo y registro de los intentos exitosos y fallidos de autenticación del sistema, registros de alarmas cuando se violan las políticas de seguridad del sistema documentados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 84 | 7.16.4.- (*) EJECUCIÓN: Mecanismos como: uso de dominios de autenticación, servidores de control de acceso y directorios utilizados/ ejecutados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 85 | 7.16.5.- (*) EJECUCIÓN: Tiempo definido de conexión de los usuarios, considerando las necesidades de la institución | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 86 | 7.16.6.- (*) EJECUCIÓN: Identificadores de aplicación controlados para que no muestren identificadores de aplicación ni de sistema, hasta que el proceso de registro se haya completado exitosamente. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 87 | 7.16.7.- (*) EJECUCIÓN: Cantidad de intentos permitidos de registro de inicio de sesión; por ejemplo, tres intentos | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 88 | 7.16.8.- (*) EJECUCIÓN: Tiempo de dilación limitado antes de permitir o rechazar más intentos adicionales del registro de inicio sin autorización específica | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 89 | 7.17.1.- (*) EJECUCIÓN: Actividades evidenciadas de las personas responsables de administraciones críticas de la institución, rastreados utilizando los identificadores de usuario | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 90 | 7.17.2.- (*) EJECUCIÓN: Usar como excepción, y solo por temas de necesidad de la institución, identificadores | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |

**HITOS**

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de usuarios para un grupo de usuarios o de trabajo específico, definido y documentado | | | | | | | |
| 91 | 7.17.3.- (*) EJECUCIÓN: Uso de usuarios genéricos restringido | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 92 | 7.17.4.- (*) EJECUCIÓN: Métodos alternos utilizados a la contraseña, como los medios criptográficos, las tarjetas inteligentes, tokens o medios biométricos de autenticación | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 93 | 7.18.1.- (*) EJECUCIÓN: Política de accesos implementada donde se indica la responsabilidad del buen uso de la contraseña y que debe ser secreta e intransferible | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 94 | 7.18.2.- (*) EJECUCIÓN: Contraseña de los usuarios y del personal de tecnología y de los administradores de tecnología, en rangos de tiempo y complejidad cambiados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 95 | 7.18.3.- (*) EJECUCIÓN: Lineamientos de cambio de contraseña obligatorio en el primer registro de acceso o inicio de sesión implementado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 96 | 7.25.1.- (*) EJECUCIÓN: Exposición de equipos portátiles en sitios inseguros, públicos y de alto riesgo registrados/controlados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 97 | 7.26.1.- (*) EJECUCIÓN: Uso de equipo de propiedad privada que no esté bajo el control y monitoreo de la institución reportado/registrado. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 98 | 7.26.2.- (*) EJECUCIÓN: Protección de antivirus y reglas del Firewall definidas/ reguladas | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 99 | 7.4.1.- (*)EJECUCIÓN: Proceso formal para la asignación y cambio de contraseñas establecido | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 100 | 7.6.1.- (*) EJECUCIÓN: Procedimiento de accesos documentado donde se indique las responsabilidades de los usuarios tanto internos como externos, sobre el uso de la cuenta y la contraseña asignados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 101 | 7.6.2.- (*) EJECUCIÓN: Lineamientos de generación de contraseñas con letras mayúsculas, minúsculas, con caracteres especiales, difíciles de descifrar, es decir, que | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cumplen una complejidad media y alta implementados | | | | | | | |
| 102 | 7.6.3.- (*) EJECUCIÓN: Lineamientos para contraseñas en blanco o que viene por defecto según el sistema el fabricante del producto, puesto que son fácilmente descifrables implementadas | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 103 | 7.6.4.- (*) EJECUCIÓN: Cambio periódico de contraseñas de los usuarios controlados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 104 | 7.6.5.- (*)EJECUCIÓN: Revisiones periódicas de la gestión de usuarios generadas y documentadas incluidos los administradores de tecnología, por parte del Oficial de Seguridad de la Información | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 105 | 7.7.1.- (*) EJECUCIÓN: Medidas implementadas para que, en un determinado tiempo, si el usuario no está realizando ningún trabajo en el equipo, este se bloquee, y se desbloquee únicamente si el usuario ingresa nuevamente su clave | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 106 | 7.8.1.- (*) EJECUCIÓN: Lineamientos de resguardo de Información sensible (cajas fuertes o gabinetes), en especial cuando no estén en uso y no se encuentre personal en la oficina implementado/ ejecutado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 107 | 7.8.2.- (*) EJECUCIÓN: Desconectar de la red, servicio o sistema, cuando se encuentren desatendidas | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 108 | 7.8.3.- (*) EJECUCIÓN: Copiadoras bloqueadas y control de acceso especial dispuesto para horario fuera de oficinas | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 109 | 7.8.4.- (*) EJECUCIÓN: Información sensible retirada una vez que ha sido impresa | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | | 11/11/2014 | | Sí | 0.79 |
| 110 | 7.8.5.- (*) EJECUCIÓN: Información sensible retirada, como las claves, de sus escritorios y pantallas | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 111 | 7.8.6.- (*) EJECUCIÓN: Dispositivos removibles retirados una vez que se hayan dejado de utilizar | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 112 | 8.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Requerimientos de seguridad definidos. Por ejemplo: criptografía, control de sesiones, etc | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 8.1.2.- (*) EJECUCIÓN: Controles apropiados definidos, tanto automatizados como manuales | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 114 | 9.1.1.- (*) EJECUCIÓN: Procedimiento formal instaurado/implementado para el reporte de los eventos de seguridad de la información junto con un procedimiento de escalada y respuesta ante el incidente | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 115 | 9.1.2.- (*) Cuando un incidente se produzca, el funcionario en turno responsable del equipo o sistema afectado, debe realizar las siguientes acciones en su orden | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 116 | 9.1.2.1.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes Identificados | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 117 | 9.1.2.2.- (*) EJECUCIÓN: Bitácora de incidentes (reporte de eventos) incluyendo fecha, hora, nombres y apellidos del funcionario en turno, departamento o área afectada, equipo o sistema afectado y breve descripción del incidente registrados. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 118 | 9.1.2.3.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes de Seguridad de la Información de la institución notificadosal Oficial de Seguridad | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 119 | 9.1.2.4.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes clasificados de acuerdo al tipo de servicio afectado y al nivel de severidad | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 120 | 9.1.2.5.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes priorizados en el caso de que se produjeran varios en forma simultanea | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 121 | 9.1.2.6.- (*) EJECUCIÓN: Diagnóstico inicial, determinando mensajes de error producidos, identificando los eventos ejecutados antes de que el incidente ocurra, recreando el incidente para identificar sus posibles causa, realizado | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 122 | 9.1.2.7.- (*) EJECUCIÓN: Incidentes escalados, en el caso que el funcionario en turno no pueda solucionarlo | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 123 | 9.1.2.8.- (*) EJECUCIÓN: Causas Investigadas y diagnosticadas en forma definitiva las por las cuales se produjo el incidente | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |
| 124 | 9.1.2.9.- (*) EJECUCIÓN: Servicio afectado por el incidente debido a la para | V - Verificación ejecutiva | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | | No | 0.79 |

## HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | de un equipo o un sistema, incluyendo un registro de la solución empleada en la bitácora de incidentes resueltos y restaurados | | | | | | | |
| 125 | CIERRE: Reporte de ejecución de primera fase finalizada. | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 0.79 |
| 126 | DEFINICIÓN: Acuerdo de implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información emitido | Z - Compromiso Ministerial | 25/09/2013 | 25/03/2015 | | ▽ | No | 1.25 |

## INDICADORES DEL PROYECTO

| | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay información disponible | | | | | | | |

## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

| | |
|---|---|
| **Anticipo Desembolsado:** | 0.00 |
| **Estimado Al Fin Del Proyecto:** | 0.00 ** |
| **Costo Total:** | 0.00 |
| **Total Devengado:** | 0.00 |
| **% Costo Total Devengado:** | 0.00 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO




**% Costo Total Devengado:** 0.00 %

| Perfil Económico 2015 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Años Previos** | **Año Actual (2015)** | **Años Futuros** | **Total** |
| **Ppto. Planeado** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Ppto. Externo Planeado** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| | | | | |
| **Ppto. Aprobado Inicial** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Ppto. Codificado** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Ppto. Comprometido** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Planeado - Codificado (2015)** | | 0.00 | | |
| | | | | |
| **Programado a Devengar** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Ppto. Devengado** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Estimado a fin de año** | * 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **% de Programado a Devengar vs. Devengado** | * 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | **0.00 %** |
| | | | | |
| **Ppto. Codificado 998** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **Ppto. Devengado 998** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |

*** Ppto. Devengado**

## OBJETIVOS ALINEADOS

| | Objetivos Operativos |
|---|---|
| 11 | Incrementar la eficacia de la Gestión Institucional MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos institucionales, el mejoramiento continuo de los procesos y el cumplimiento de recomendaciones, resoluciones y disposiciones. |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|---|---|---|
| 1 | EGSI_SENATEL_1.1.1_P_01_20140314 | EGSI_SENATEL_1.1.1_P_01_20140314.pdf | 13/11/2014 |
| 2 | EGSI_SENATEL_1.1.1_P_02_20140314 | EGSI_SENATEL_1.1.1_P_02_20140314.pdf | 13/11/2014 |
| 3 | EGSI_SENATEL_1.1.1_P_03_20140324 | EGSI_SENATEL_1.1.1_P_03_20140324.pdf | 13/11/2014 |
| 4 | EGSI_SENATEL_1.1.2_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_1.1.2_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 5 | EGSI_SENATEL_1.2.1_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_1.2.1_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 6 | EGSI_SENATEL_2.1.1_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_2.1.1_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 7 | EGSI_SENATEL_2.1.2_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_2.1.2_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 8 | EGSI_SENATEL_2.1.3_P_01_20140324 | EGSI_SENATEL_2.1.3_P_01_20140314.pdf | 13/11/2014 |
| 9 | EGSI_SENATEL_2.2.1.1_P_01_20140324 | EGSI_SENATEL_2.2.1.1_P_01_20140314.pdf | 13/11/2014 |

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|---|---|---|---|
| 10 | EGSI_SENATEL_2.2.1.2_P_01_20140324 | EGSI_SENATEL_2.2.1.2_P_01_20140314.pdf | 13/11/2014 |
| 11 | EGSI_SENATEL_2.5.1_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_2.5.1_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 12 | EGSI_SENATEL_2.5.2_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_2.5.2_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 13 | EGSI_SENATEL_2.5.3_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_2.5.3_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 14 | EGSI_SENATEL_2.5.4_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_2.5.4_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 15 | EGSI_SENATEL_2.5.5_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_2.5.5_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 16 | EGSI_SENATEL_3.1.2.1_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.2.1_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 17 | EGSI_SENATEL_3.1.2.2_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.2.2_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 18 | EGSI_SENATEL_3.1.2.3_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.2.3_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 19 | EGSI_SENATEL_3.1.2.4_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.2.4_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 20 | EGSI_SENATEL_3.1.2.5_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.2.5_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 21 | EGSI_SENATEL_3.1.2.6_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.2.6_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 22 | EGSI_SENATEL_3.1.2.7_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.2.7_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 23 | EGSI_SENATEL_3.1.2.8_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.2.8_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 24 | EGSI_SENATEL_3.1.3.1_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.3.1_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 25 | EGSI_SENATEL_3.1.3.2_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.3.2_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 26 | EGSI_SENATEL_3.1.3.3_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.3.3_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 27 | EGSI_SENATEL_3.1.3.4_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.3.4_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 28 | EGSI_SENATEL_3.1.4.1_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.4.1_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 29 | EGSI_SENATEL_3.1.4.2_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.4.2_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 30 | EGSI_SENATEL_3.1.4.3_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.4.3_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 31 | EGSI_SENATEL_3.1.4.4_P_01_20140814 | EGSI_SENATEL_3.1.4.4_P_01_20140814.pdf | 13/11/2014 |
| 32 | EGSI_SENATEL_3.4.1_P_01_20140916 | EGSI_SENATEL_3.4.1_P_01_20140916.pdf | 13/11/2014 |
| 33 | EGSI_SENATEL_5.1.1_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_5.1.1_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 34 | EGSI_SENATEL_5.2.1_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_5.2.1_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 35 | EGSI_SENATEL_5.2.2_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_5.2.2_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 36 | EGSI_SENATEL_5.3.1_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_5.3.1_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 37 | EGSI_SENATEL_5.3.2_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_5.3.2_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 38 | EGSI_SENATEL_5.4.1_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_5.4.1_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 39 | EGSI_SENATEL_5.5.1_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_5.5.1_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 40 | EGSI_SENATEL_5.6.1_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_5.6.1_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 41 | EGSI_SENATEL_7.8.3_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_7.8.3_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 42 | EGSI_SENATEL_7.8.4_P_01_20141111 | EGSI_SENATEL_7.8.4_P_01_20141111.pdf | 13/11/2014 |
| 43 | Oficio de Cancelación del Proyecto por parte de la SNAP | SNAP-SGE-2015-000083-0.pdf | 13/03/2015 |
